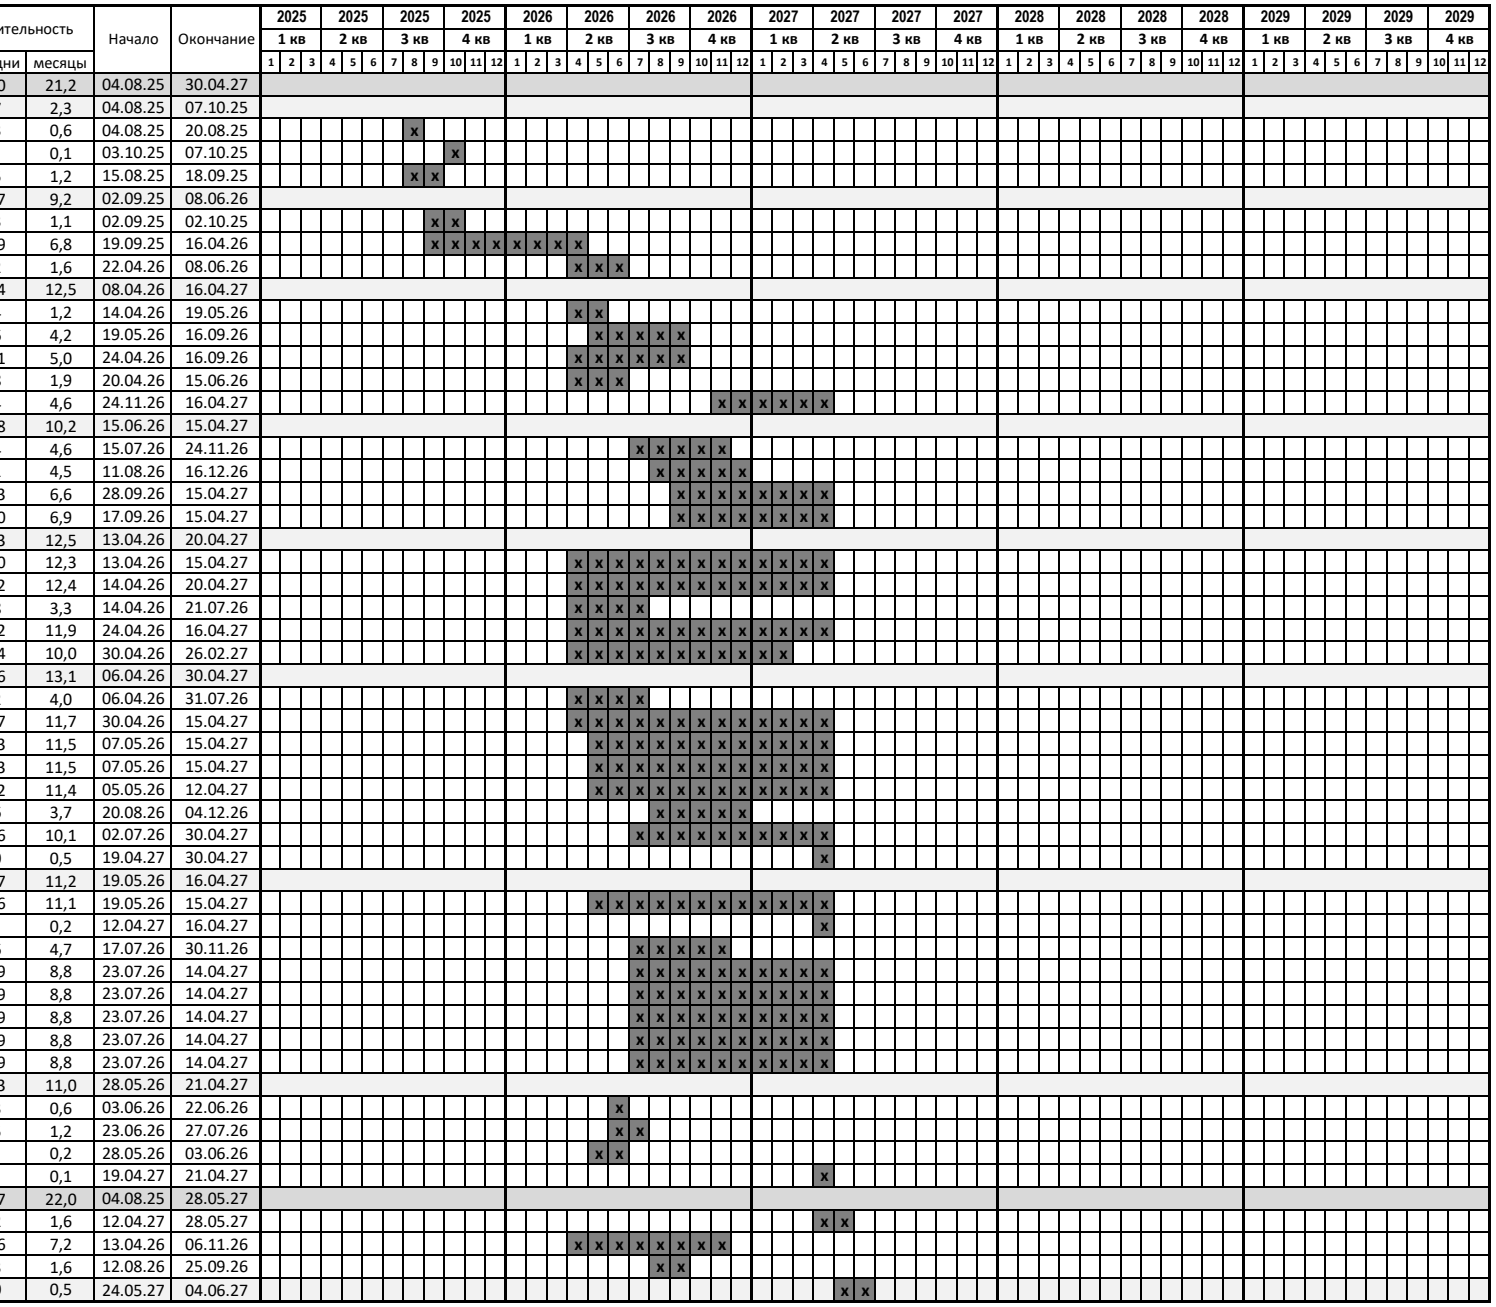Шифр	А	Название раздела	Длительность		Начало	Окончание
			раб.дни	месяцы		
4		**Строительство**	430	21,2	04.08.25	30.04.27
41		**Основания и фундаменты**	47	2,3	04.08.25	07.10.25
411		Устройство котлована	13	0,6	04.08.25	20.08.25
412		Обратная засыпка котлована	3	0,1	03.10.25	07.10.25
413		Фундаменты	25	1,2	15.08.25	18.09.25
42		**Несущие и ограждающие конструкции здания**	187	9,2	02.09.25	08.06.26
421		Конструкции подземной части здания	23	1,1	02.09.25	02.10.25
422		Конструкции надземной части здания	139	6,8	19.09.25	16.04.26
424		Приямки и крыльца	32	1,6	22.04.26	08.06.26
43		**Фасад и кровля, окна и двери**	254	12,5	08.04.26	16.04.27
431		Кровля	24	1,2	14.04.26	19.05.26
432		Фасад	86	4,2	19.05.26	16.09.26
433		Архитектурное освещение фасада	101	5,0	24.04.26	16.09.26
434		Окна и витражи	38	1,9	20.04.26	15.06.26
437		Двери	94	4,6	24.11.26	16.04.27
44		**Перегородки и отделка помещений**	208	10,2	15.06.26	15.04.27
441		Внутренние каменные стены и перегородки	94	4,6	15.07.26	24.11.26
442		Внутренние облегчённые перегородки на каркасе	91	4,5	11.08.26	16.12.26
443		Отделка мест общего пользования (коридоры, лестницы, лифтовые хо	133	6,6	28.09.26	15.04.27
444		Отделка помещений	140	6,9	17.09.26	15.04.27
45		**Водоснабжение и канализация, пожаротушение и газоснабжение**	253	12,5	13.04.26	20.04.27
451		Система водоснабжения	250	12,3	13.04.26	15.04.27
452		Система водоотведения	252	12,4	14.04.26	20.04.27
453		Система дождевой канализации	68	3,3	14.04.26	21.07.26
454		Противопожарный водопровод	242	11,9	24.04.26	16.04.27
455		Система автоматического пожаротушения	204	10,0	30.04.26	26.02.27
46		**Отопление, вентиляция и кондиционирование в т.ч тепловой пункт**	266	13,1	06.04.26	30.04.27
461		Система отопления здания	82	4,0	06.04.26	31.07.26
462		Система вытяжной вентиляции	237	11,7	30.04.26	15.04.27
463		Система приточно-вытяжной вентиляции	233	11,5	07.05.26	15.04.27
464		Система противодымной вентиляции	233	11,5	07.05.26	15.04.27
465		Система кондиционирования здания	232	11,4	05.05.26	12.04.27
466		Диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования	76	3,7	20.08.26	04.12.26
467		Тепловой пункт в здании (ТП/ИТП/ЦТП)	206	10,1	02.07.26	30.04.27
468		Сдача теплового пункта госнадзору	10	0,5	19.04.27	30.04.27
47		**Электроснабжение и слаботочные системы**	227	11,2	19.05.26	16.04.27
471		Система электроснабжения в т.ч. освещение	226	11,1	19.05.26	15.04.27
472		Сдача электроснабжения госнадзору и подключение по постоянной сх	5	0,2	12.04.27	16.04.27
473		Автоматизация инженерных систем	96	4,7	17.07.26	30.11.26
474		Система пожарной сигнализации	179	8,8	23.07.26	14.04.27
475		Система охранной сигнализации	179	8,8	23.07.26	14.04.27
476		Система контроля доступа в т. ч. домофоны	179	8,8	23.07.26	14.04.27
477		Система видеонаблюдения здания	179	8,8	23.07.26	14.04.27
478		Системы связи и информационные сети здания	179	8,8	23.07.26	14.04.27
48		**Лифты**	223	11,0	28.05.26	21.04.27
481		Строительные работы и отделка лифтовых шахт	13	0,6	03.06.26	22.06.26
482		Монтаж лифтов, порталов и порогов, диспетчеризация лифтов	25	1,2	23.06.26	27.07.26
483		Монтаж подъёмного оборудования лифтов	5	0,2	28.05.26	03.06.26
484		Сдача лифтов госнадзору	3	0,1	19.04.27	21.04.27
5		**Благоустройство и наружные сети**	447	22,0	04.08.25	28.05.27
51		Благоустройство и озеленение	32	1,6	12.04.27	28.05.27
52		Наружные сети внутриплощадочные (до строящегося здания)	146	7,2	13.04.26	06.11.26
54		Технологическое присоединение инженерных сетей	33	1,6	12.08.26	25.09.26
622		**Сдача объекта Госстройнадзору**	10	0,5	24.05.27	04.06.27
