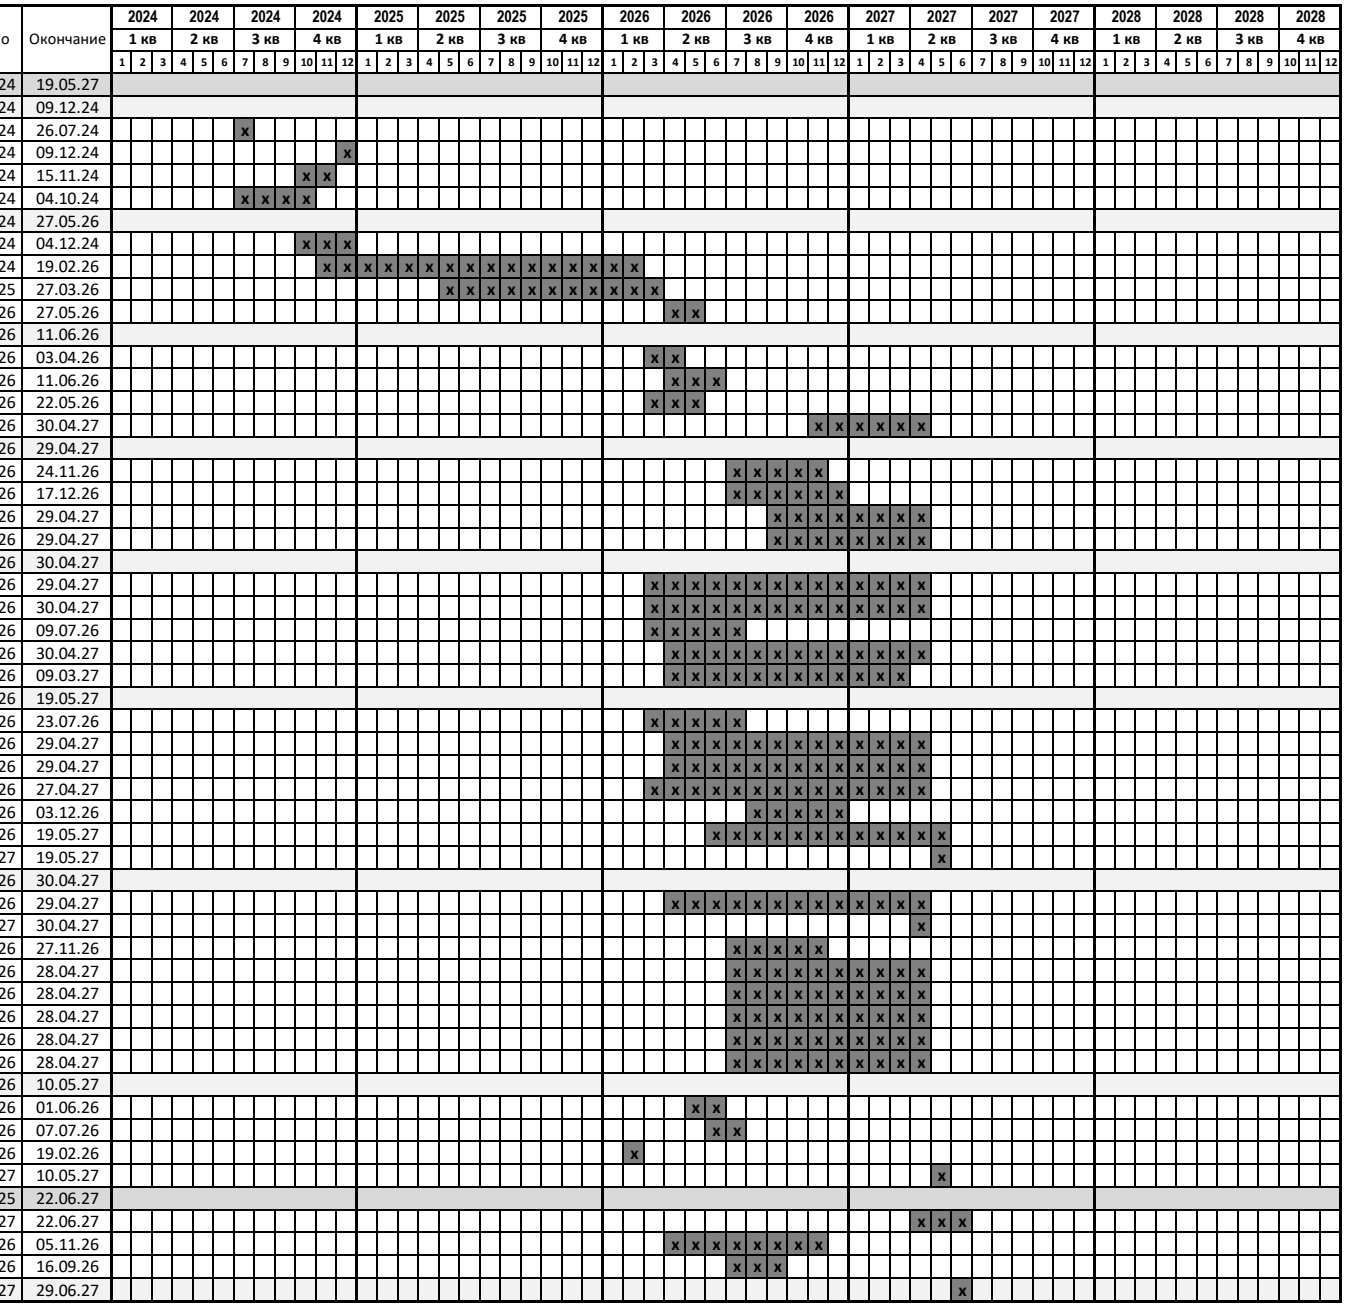Шифр	А	Название раздела	Длительность		Начало	Окончание
			раб.дни	месяцы		
4		**Строительство**	704	34,7	09.07.24	19.05.27
41		**Основания и фундаменты**	109	5,4	09.07.24	09.12.24
411		Устройство котлована	14	0,7	09.07.24	26.07.24
412		Обратная засыпка котлована	3	0,1	05.12.24	09.12.24
413		Фундаменты	29	1,4	07.10.24	15.11.24
415		Шпунтовые ограждения или стена в грунте	55	2,7	22.07.24	04.10.24
42		**Несущие и ограждающие конструкции здания**	386	19,0	25.10.24	27.05.26
421		Конструкции подземной части здания	28	1,4	25.10.24	04.12.24
422		Конструкции надземной части здания	301	14,8	25.11.24	19.02.26
423		Ограждающие конструкций здания	208	10,2	23.05.25	27.03.26
424		Приямки и крыльца	32	1,6	10.04.26	27.05.26
43		**Фасад и кровля, окна и двери**	290	14,3	02.03.26	11.06.26
431		Кровля	24	1,2	02.03.26	03.04.26
432		Фасад	33	1,6	24.04.26	11.06.26
434		Окна и витражи	38	1,9	30.03.26	22.05.26
437		Двери	103	5,1	25.11.26	30.04.27
44		**Перегородки и отделка помещений**	223	11,0	05.06.26	29.04.27
441		Внутренние каменные стены и перегородки	103	5,1	02.07.26	24.11.26
442		Внутренние облегчённые перегородки на каркасе	100	4,9	30.07.26	17.12.26
443		Отделка мест общего пользования (коридоры, лестницы, лифтовые хо	147	7,2	22.09.26	29.04.27
444		Отделка помещений	155	7,6	10.09.26	29.04.27
45		**Водоснабжение и канализация, пожаротушение и газоснабжение**	275	13,5	24.03.26	30.04.27
451		Система водоснабжения	274	13,5	24.03.26	29.04.27
452		Система водоотведения	275	13,5	24.03.26	30.04.27
453		Система дождевой канализации	75	3,7	24.03.26	09.07.26
454		Противопожарный водопровод	267	13,2	03.04.26	30.04.27
455		Система автоматического пожаротушения	225	11,1	09.04.26	09.03.27
46		**Отопление, вентиляция и кондиционирование в т.ч тепловой пункт**	291	14,3	16.03.26	19.05.27
461		Система отопления здания	91	4,5	16.03.26	23.07.26
463		Система приточно-вытяжной вентиляции	258	12,7	15.04.26	29.04.27
464		Система противодымной вентиляции	258	12,7	15.04.26	29.04.27
465		Система кондиционирования здания	273	13,4	23.03.26	27.04.27
466		Диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования	82	4,0	11.08.26	03.12.26
467		Тепловой пункт в здании (ТП/ИТП/ЦТП)	221	10,9	25.06.26	19.05.27
468		Сдача теплового пункта госнадзору	10	0,5	05.05.27	19.05.27
47		**Электроснабжение и слаботочные системы**	252	12,4	24.04.26	30.04.27
471		Система электроснабжения в т.ч. освещение	251	12,4	24.04.26	29.04.27
472		Сдача электроснабжения госнадзору и подключение по постоянной сх	5	0,2	26.04.27	30.04.27
473		Автоматизация инженерных систем	104	5,1	06.07.26	27.11.26
474		Система пожарной сигнализации	199	9,8	09.07.26	28.04.27
475		Система охранной сигнализации	199	9,8	09.07.26	28.04.27
476		Система контроля доступа в т. ч. домофоны	199	9,8	09.07.26	28.04.27
477		Система видеонаблюдения здания	199	9,8	09.07.26	28.04.27
478		Системы связи и информационные сети здания	199	9,8	09.07.26	28.04.27
48		**Лифты**	303	14,9	13.02.26	10.05.27
481		Строительные работы и отделка лифтовых шахт	14	0,7	13.05.26	01.06.26
482		Монтаж лифтов, порталов и порогов, диспетчеризация лифтов	25	1,2	02.06.26	07.07.26
483		Монтаж подъёмного оборудования лифтов	5	0,2	13.02.26	19.02.26
484		Сдача лифтов госнадзору	3	0,1	05.05.27	10.05.27
5		**Благоустройство и наружные сети**	492	24,2	24.06.25	22.06.27
51		Благоустройство и озеленение	39	1,9	23.04.27	22.06.27
52		Наружные сети внутриплощадочные (до строящегося здания)	153	7,5	01.04.26	05.11.26
54		Технологическое присоединение инженерных сетей	54	2,7	03.07.26	16.09.26
622		**Сдача объекта Госстройнадзору**	10	0,5	16.06.27	29.06.27
